


COMUNE DI  
FAGNANO CASTELLO (CS)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO  
PARCO VERDE ATTREZZATO

COMMITENTE: COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

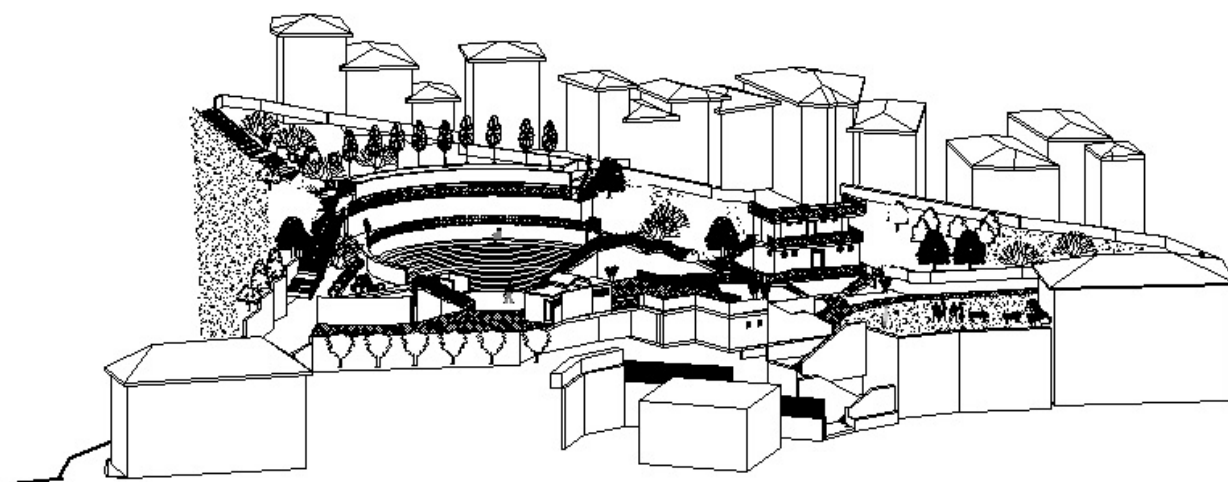

**16**

ALLEGATI:  
CRONOPROGRAMMA

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Gemino Aloia

I progettisti

Arch. Albino Gallo - Arch. Giuseppe Tundis

## Cronoprogramma - Teatro\fagnano

Descrizione gruppi omogenei di lavorazione	Importo lavori	Data inizio	Data fine	Gior tota	% manod.	Gior util
Opere in cemento armato	14 950	Ven 01/01/2010	Mer 27/01/2010	26	40	18
Murature	2 006	Mer 27/01/2010	Mar 02/02/2010	6	49,78	4
Demolizioni	413	Mar 02/02/2010	Mer 03/02/2010	1	76,78	1
impianti elettrico idrico fognario	12 942	Mer 03/02/2010	Gio 18/02/2010	15	23,99	11
Scavi rilevati e rinterri	2 730	Gio 18/02/2010	Ven 19/02/2010	1	18,61	1
Sanitari e rubinetterie	2 096	Ven 19/02/2010	Lun 22/02/2010	3	18	1
Verde arredo urbano	2 281	Lun 22/02/2010	Mer 24/02/2010	2	45	2
Opere metalliche	7 463	Mer 24/02/2010	Gio 25/02/2010	1	5,97	1
Intonaci	4 906	Gio 25/02/2010	Gio 11/03/2010	14	70,25	10
infissi interni ed esterni	2 234	Gio 11/03/2010	Ven 12/03/2010	1	5,88	1
Pavimenti e rivestimenti	72 979	Ven 12/03/2010	Lun 31/05/2010	80	42	56
